Bauzeitenplan

Bauvorhaben: Nummer und Name, z. B. 27-014 Wohnpark Seeblick, Haus 2

Firma: dein Betrieb

Stand: TT.MM.JJJJ

Fassung: Nummer und Grund der Änderung

Start und Ende als Datum, die Balken zeichnet Excel selbst. Vorgänger: Nummer des Vorgangs, der vorher fertig sein muss. Vertragsfristen als Meilenstein.

Nr.	Vorgang	Typ	Gewerk	Zuständig	Vorgänger	Start	Ende	Arbeitstage	Fortschritt (%)	Status

Bauzeitenplan

Bauvorhaben: Nummer und Name, z. B. 27-014 Wohnpark Seeblick, Haus 2

Firma: dein Betrieb

Stand: TT.MM.JJJJ

Fassung: Nummer und Grund der Änderung

Start und Ende als Datum, die Balken zeichnet Excel selbst. Vorgänger: Nummer des Vorgangs, der vorher fertig sein muss. Vertragsfristen als Meilenstein.


Nr.	Vorgang	Typ	Gewerk	Zuständig	Vorgänger	Start	Ende	Arbeitstage	Fortschritt (%)	Status

Bauzeitenplan – Beispiel

Bauvorhaben: 27-014 Wohnpark Seeblick, Haus 2
Firma: Musterbau GmbH
Stand: 31.03.2027
Fassung: 2, Bodenplatte nach Behinderung eine Woche später

Start und Ende als Datum, die Balken zeichnet Excel selbst. Vorgänger: Nummer des Vorgangs, der vorher fertig sein muss. Vertragsfristen als Meilenstein.

Nr.	Vorgang	Typ	Gewerk	Zuständig	Vorgänger	Start	Ende	Arbeitstage	Fortschritt (%)	Status
1	**Rohbau**	**Gruppe**				**01.03.2027**	**05.05.2027**	**46**		**Läuft**
1.1	Baustelleneinrichtung	Vorgang	Rohbau	Frank Neumann		01.03.2027	05.03.2027	5	100 %	Fertig
1.2	Erdarbeiten	Vorgang	Erdbau	Erdbau Müller	1.1	08.03.2027	19.03.2027	10	100 %	Fertig
1.3	Bodenplatte	Vorgang	Rohbau	Frank Neumann	1.2	22.03.2027	09.04.2027	13	30 %	Verzögert
1.4	Wände und Decken	Vorgang	Rohbau	Frank Neumann	1.3	12.04.2027	05.05.2027	18		Geplant
1.5	Rohbau fertig, Vertragsfrist	Meilenstein			1.4	30.04.2027	30.04.2027			Geplant
2	**Ausbau**	**Gruppe**				**10.05.2027**	**02.07.2027**	**39**		**Geplant**
2.1	Fenster	Vorgang	Fenster	Fensterbau Ost	1.4	10.05.2027	21.05.2027	9		Geplant
2.2	Elektro Rohinstallation	Vorgang	Elektro	Elektro Brandt	1.4	10.05.2027	28.05.2027	14		Geplant
2.3	Innenputz	Vorgang	Innenputz	Weber Putz GmbH	2.2	31.05.2027	18.06.2027	15		Geplant
2.4	Estrich	Vorgang	Estrich	Estrich Yilmaz	2.3	21.06.2027	02.07.2027	10		Geplant

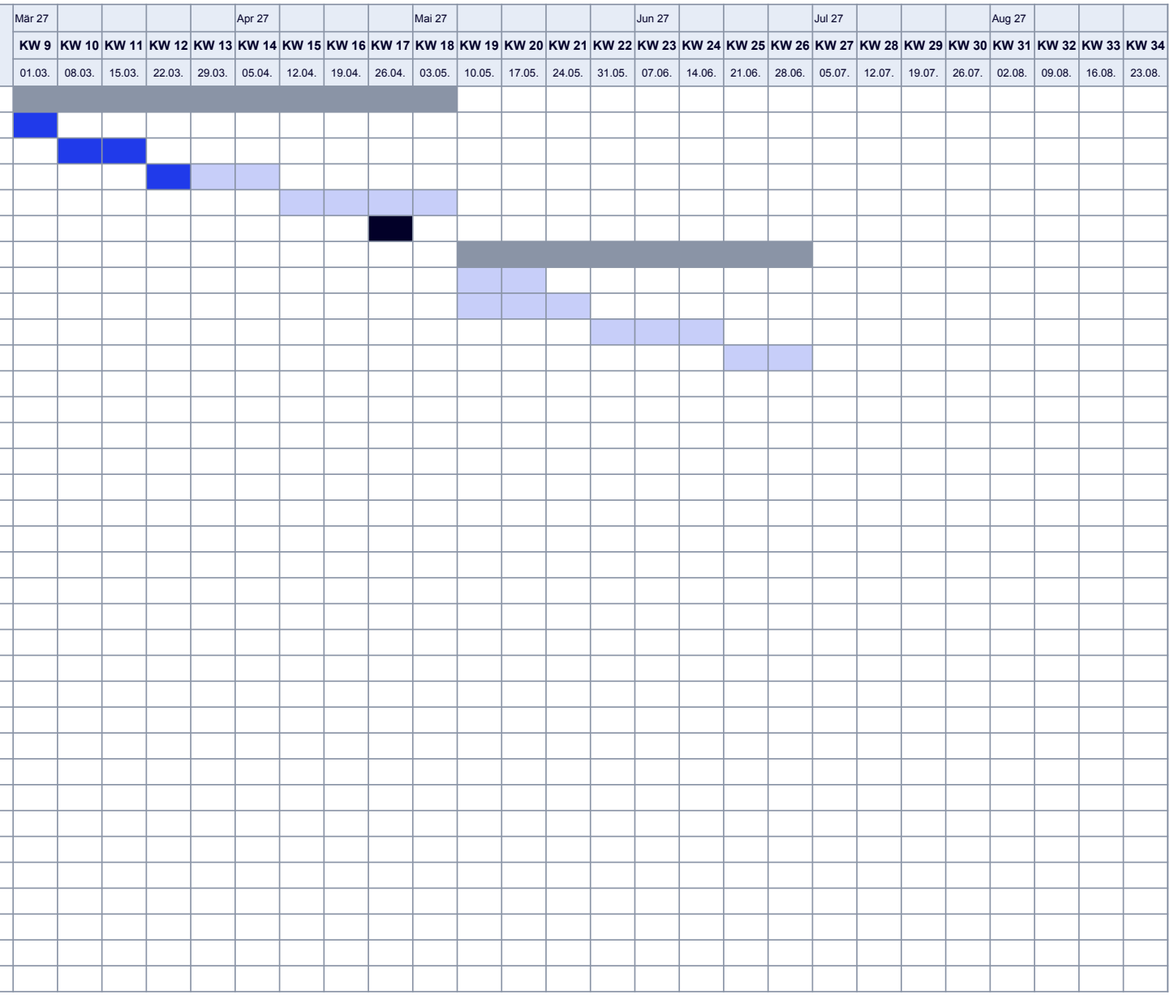

Legende

- geplant (Start bis Ende)
- erledigt (Fortschritt in Prozent)
- Meilenstein
- Gruppe (fasst Vorgänge zusammen)
- rote Linie: diese Woche
- Start rot: liegt nicht nach dem Ende des Vorgängers

Feiertage und Betriebsruhe (zählen nicht als Arbeitstage)

26.03.27	29.03.27	06.05.27	17.05.27				

Stand 7. November 2026 · Vorlage von digital-vereinfacht.de · Schneller in dive: Vorgänge mit Abhängigkeiten, Nachfolger rücken automatisch mit, Plan als PDF · digital-vereinfacht.de/wissen/bauzeitenplan-vorlage · Fußzeile vor dem Einsatz löschen.
